



**La Roche
Bernard**

**AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
RUE SAINT-JAMES**

Projet – Réunion Publique du 06 juillet 2026

Juillet 2026







Aménagements







Voirie : Enrobé




Voirie : Pavés mosaïques



Trottoirs : Dalles en granit 3 formats



Stationnements longitudinaux :
Pavés en granit

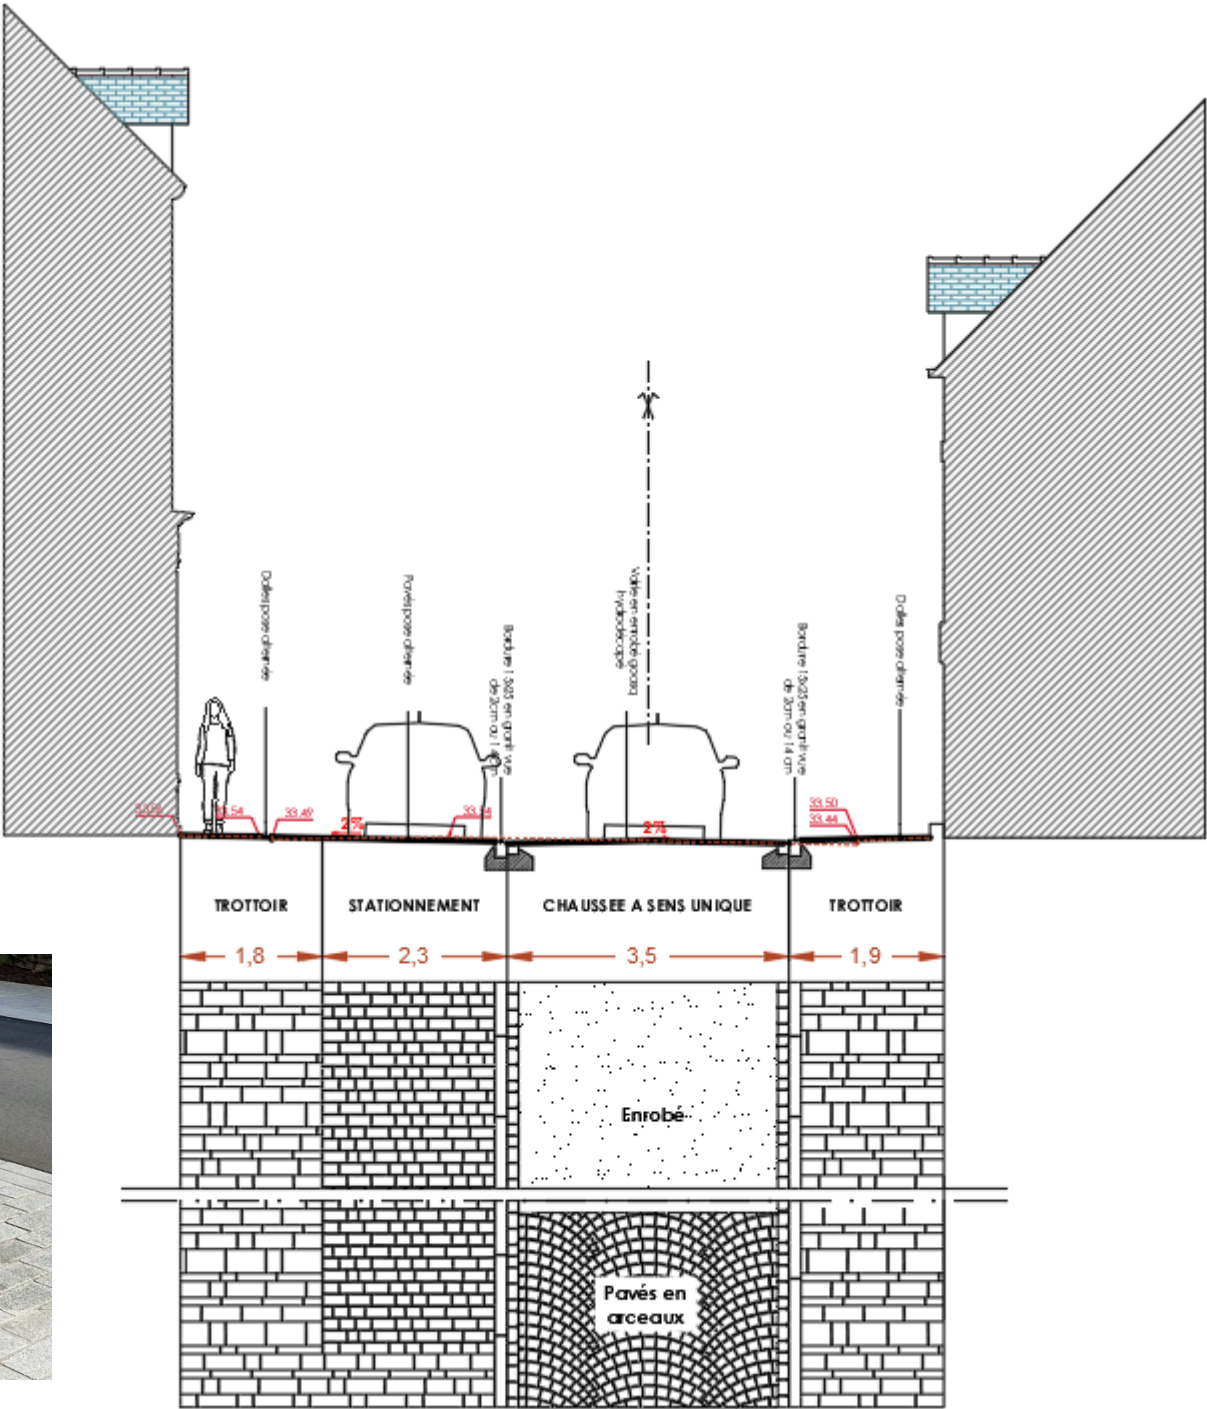




Plantes grimpantes: dès que possible – fosses de 30x30 calés selon plan des gouttières



Transplantation des buis existants

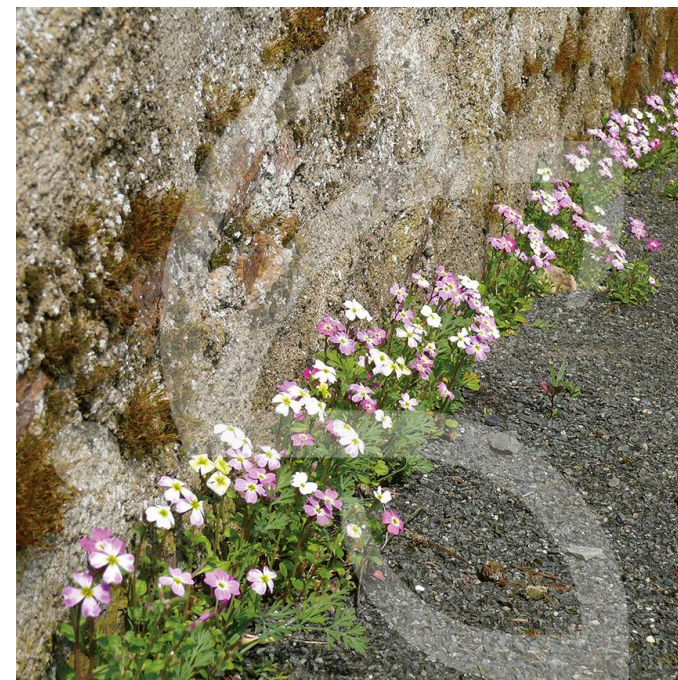


Végétation pieds de façade : Mélange Nova Flore
Couv'Fissures Connect







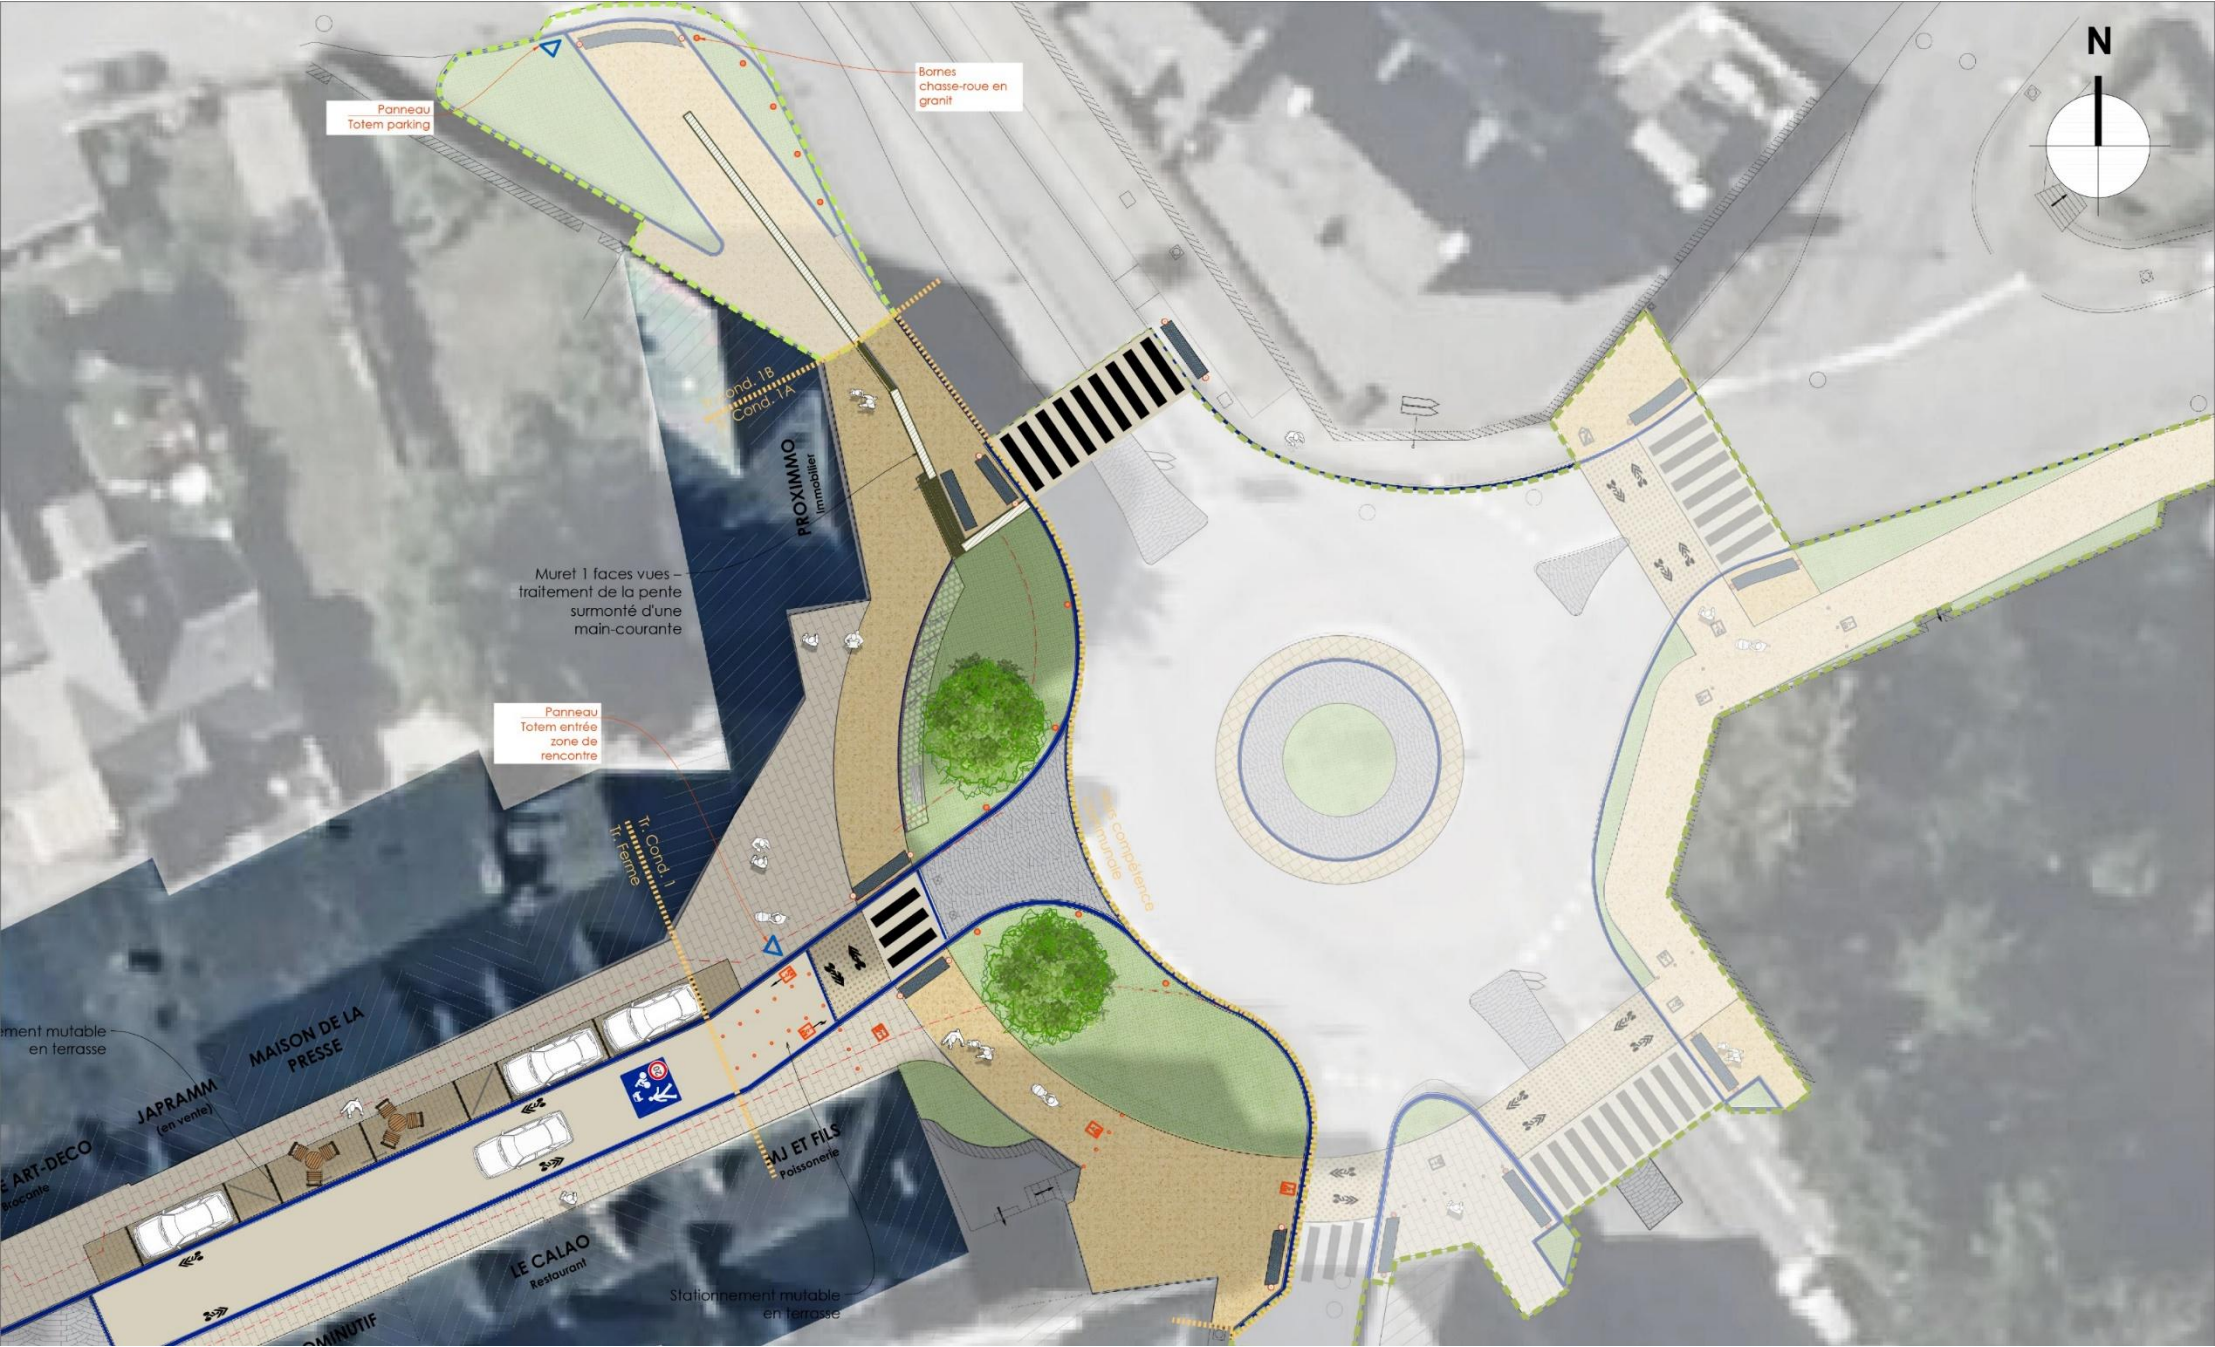



Méthodologie

Organisation générale du chantier




PLAN DE DEVIATION

PHASE N°1 – DU 28/09 au 10 OCT 2026

Pose du réseau d'eaux pluviales sur la partie basse de la rue Saint James jusqu'à la place Duguesclin.

- Circulation des véhicules conservée depuis le haut de la rue St James. Sortie obligatoire rue du Four
- Parking existant sur la place conservé. Identification de place réservé livraison
- Cheminement piéton conservé sur l'ensemble de la rue Saint James et de la rue du Four

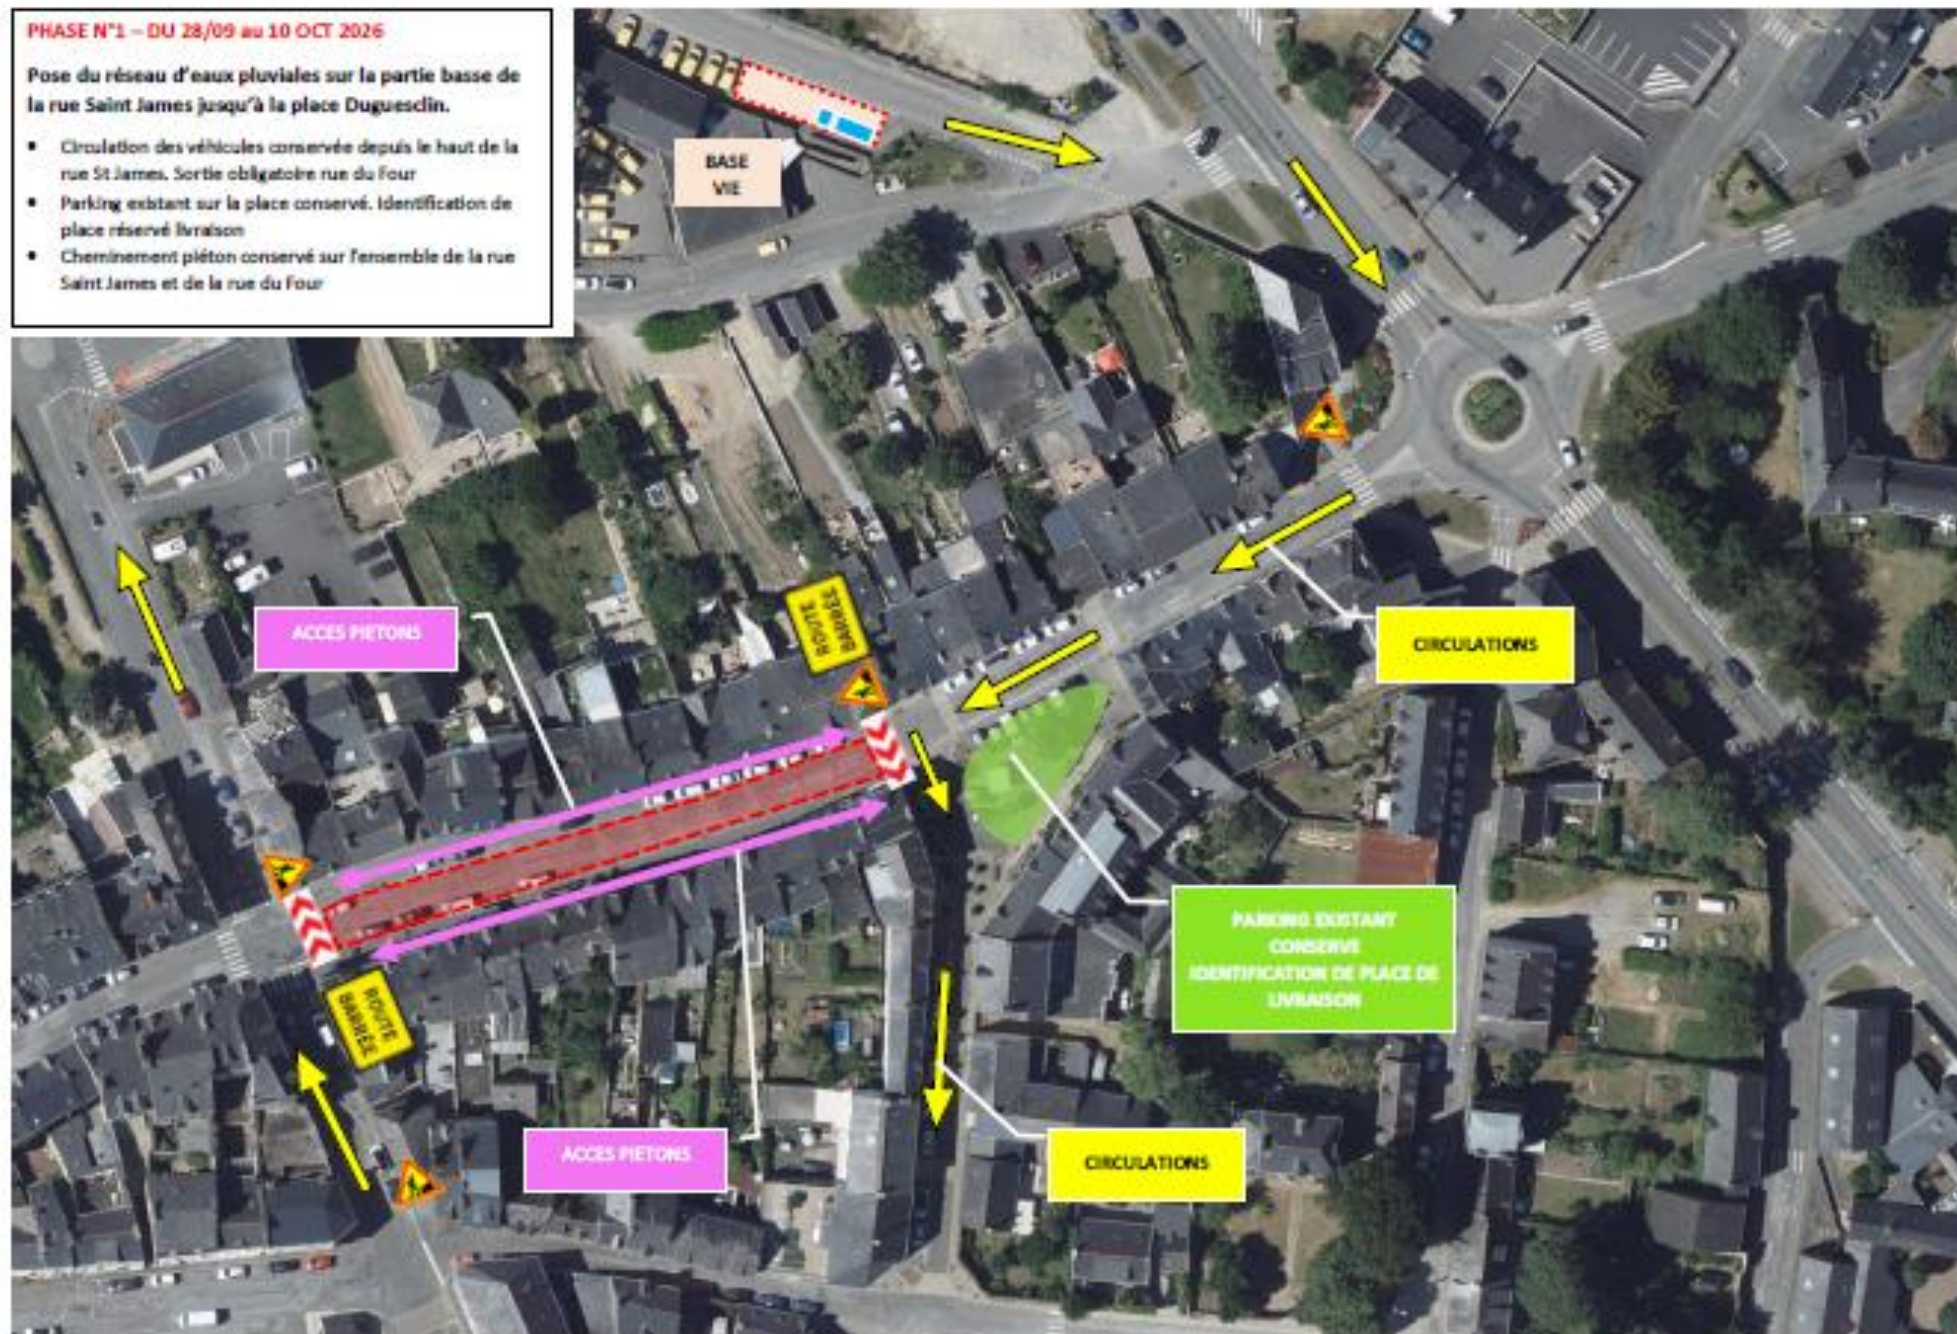


PLAN DE DEVIATION

PHASE N°2 – DU 13 au 23 OCT 2026

Pose du réseau d'eaux pluviales sur la partie haute de la rue Saint James.


- Création d'une circulation provisoire en sens unique en montant la rue St James. Sortie rue du Four
- Identification de stationnement livraison
- Cheminement piéton conservé sur l'ensemble de la rue Saint James et de la rue du Four

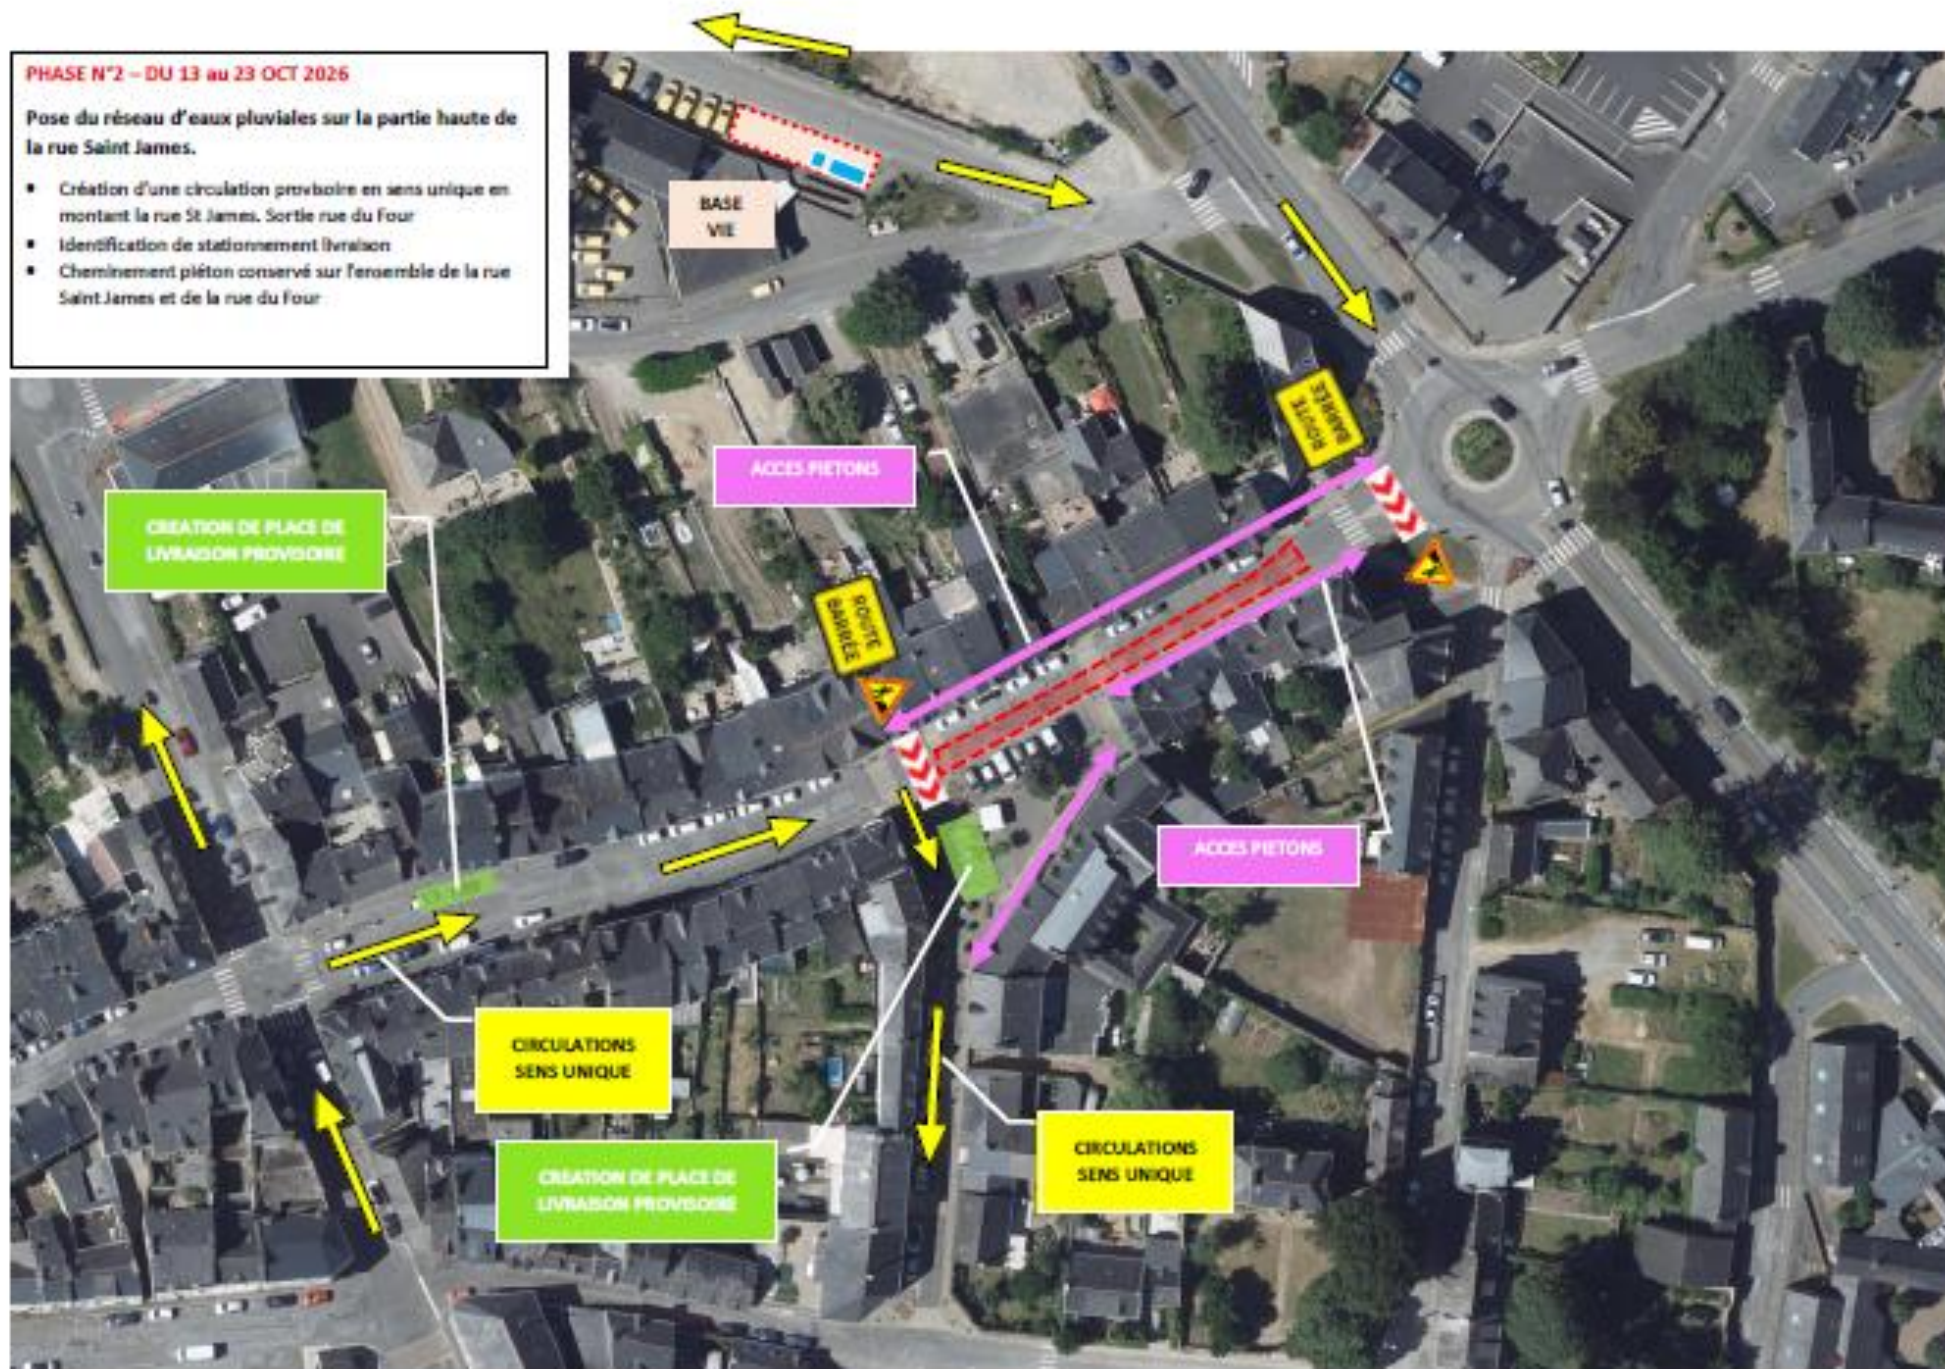

PLAN DE DEVIATION

PHASE N°2 BIS – 543-44-45 2026


STURNO A

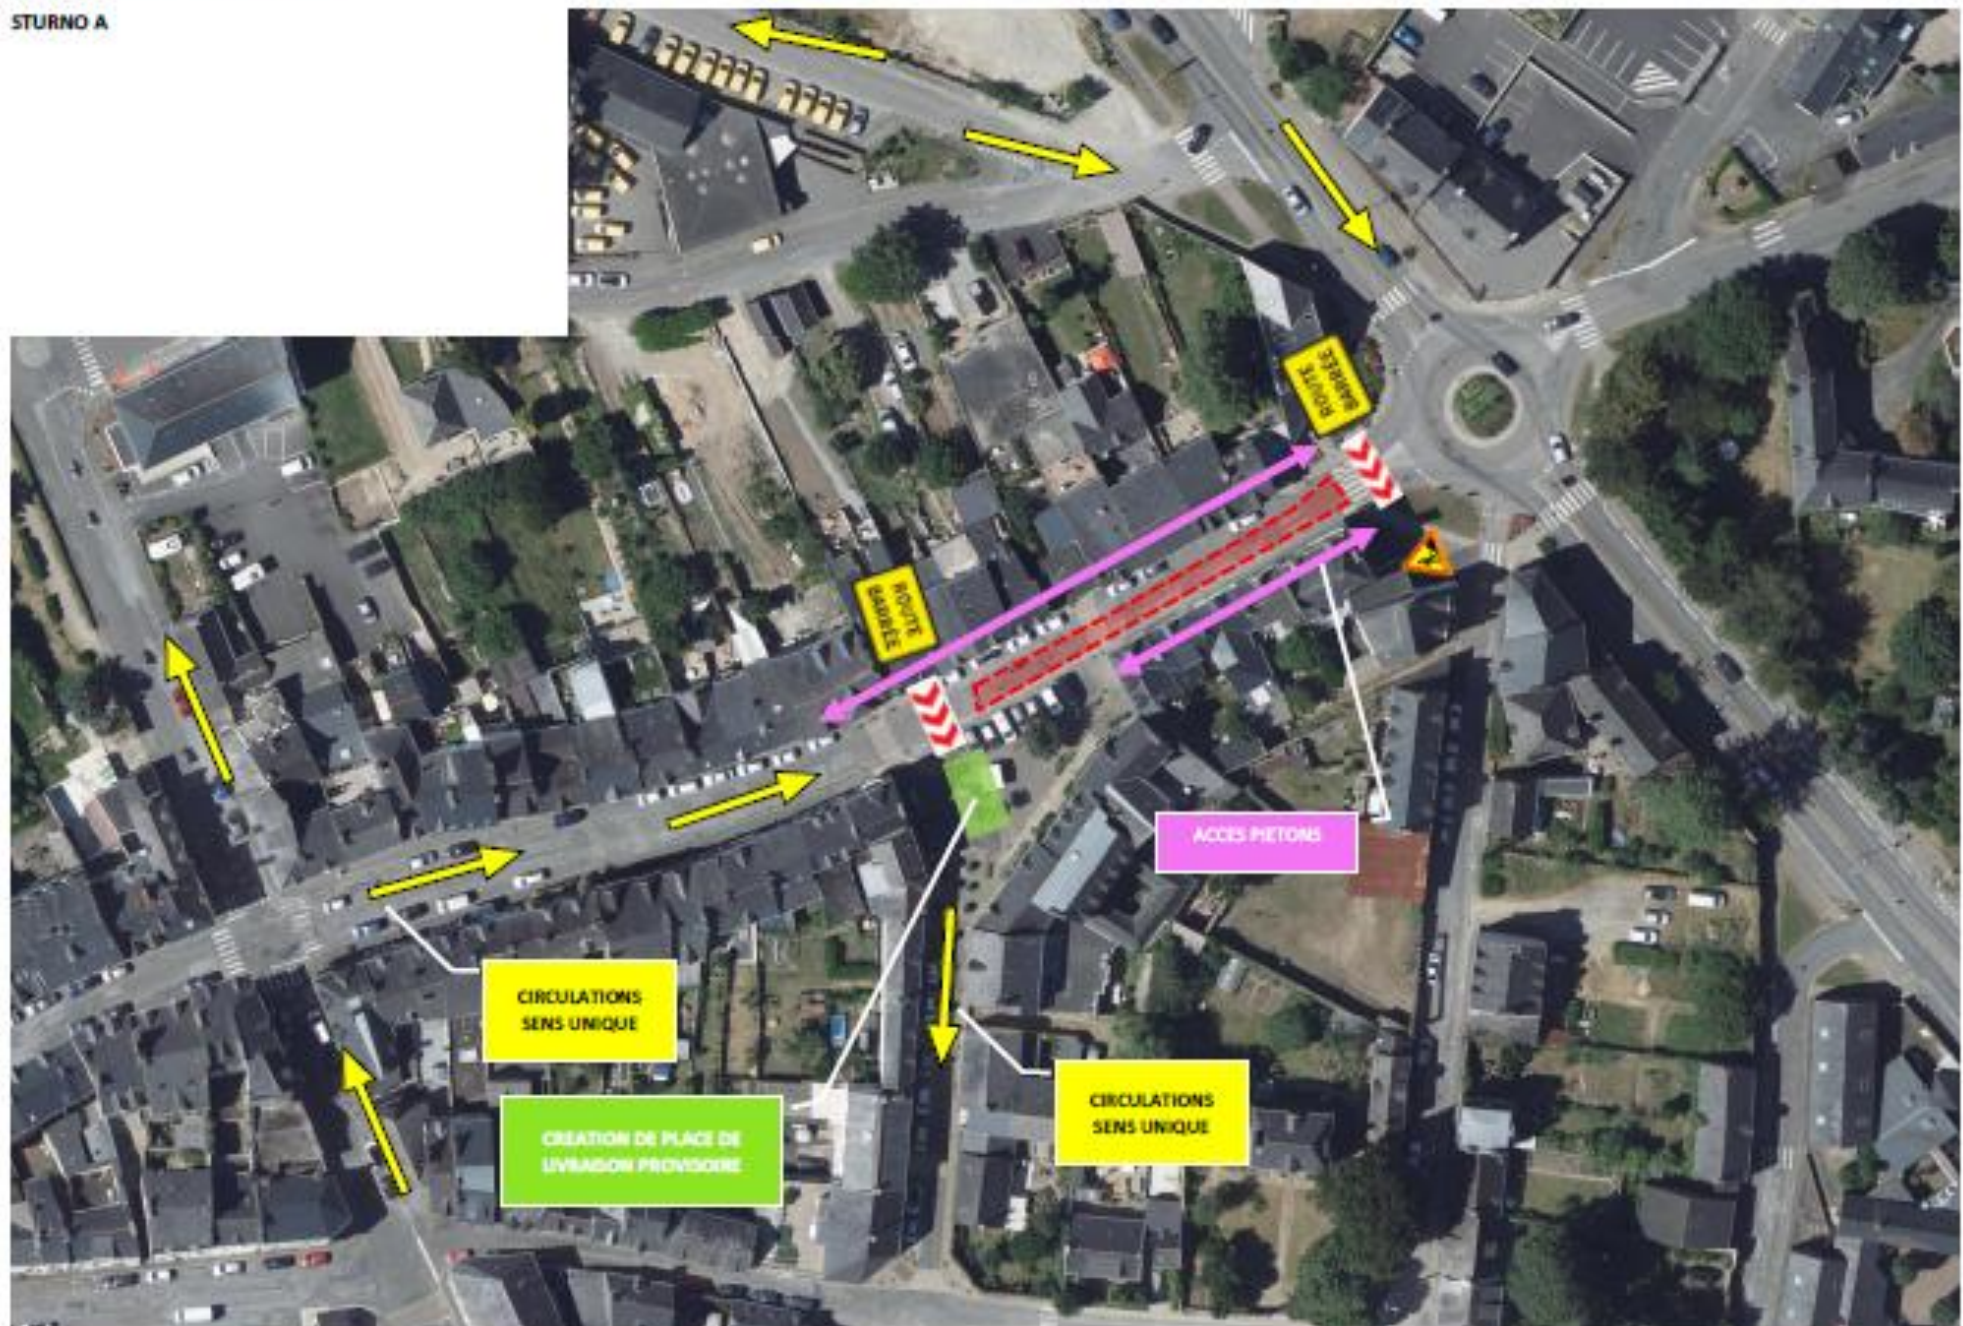

PLAN DE DEVIATION

PHASE N°2 TER – 546-47-48 2026

• STURNO AEP

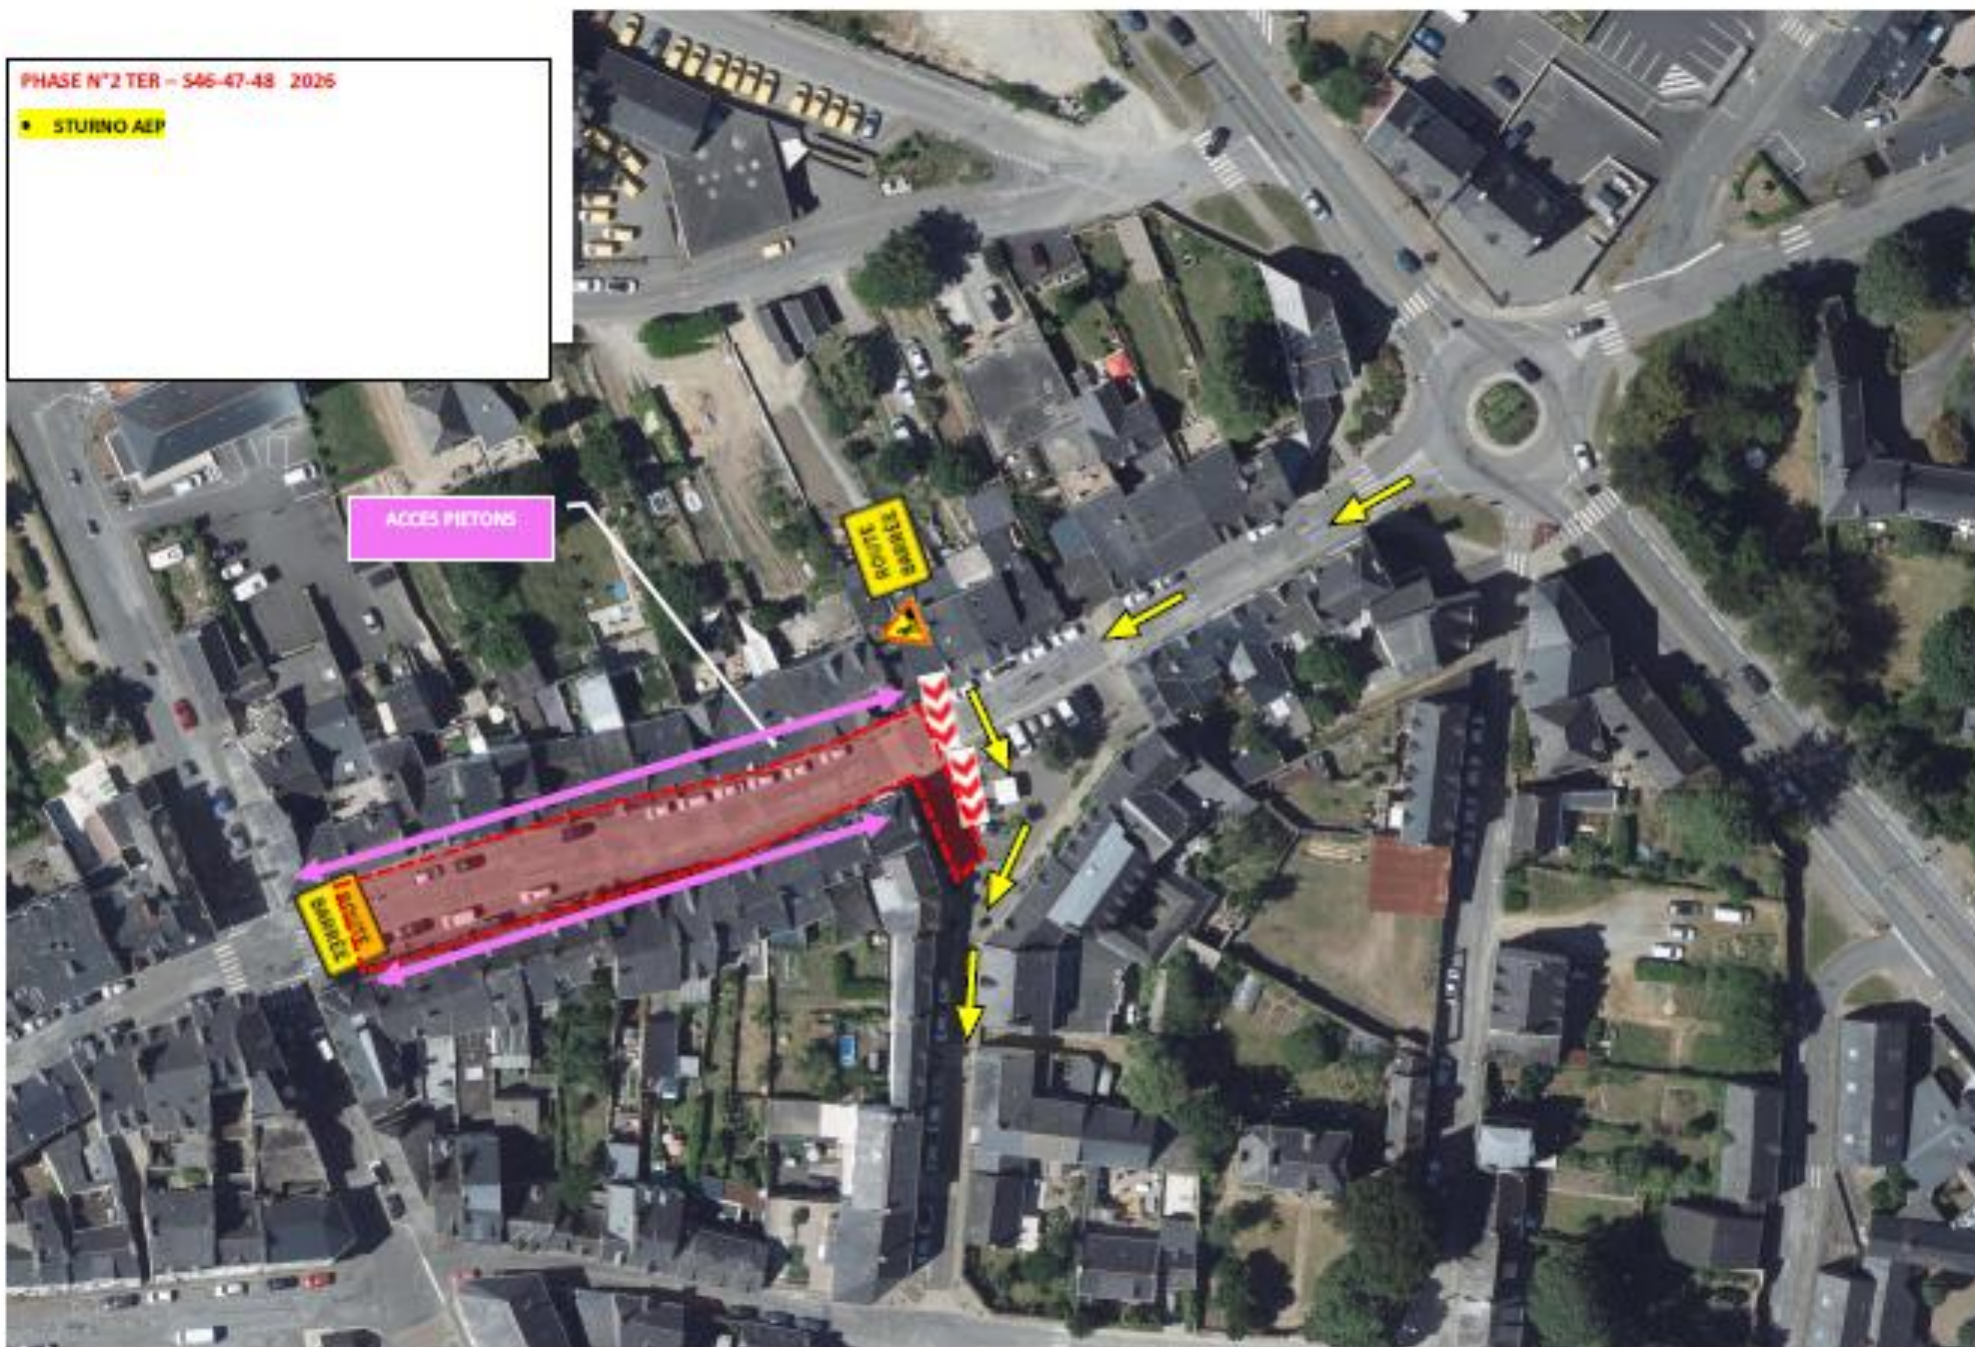


PLAN DE DEVIATION

PHASE N°3 – Janvier – Février 2027

Préparation et réalisation des travaux VRD et revêtements, en coordination avec l'entreprise paysagère, sur la partie haute de la rue Saint James jusqu'en bas de la place Duguesclin.


- Création d'une circulation provisoire en sens unique en montant la rue St James. Sortie rue du Four
- Identification de stationnement livraison
- Cheminement piéton conservé sur l'ensemble de la rue Saint James et de la rue du Four

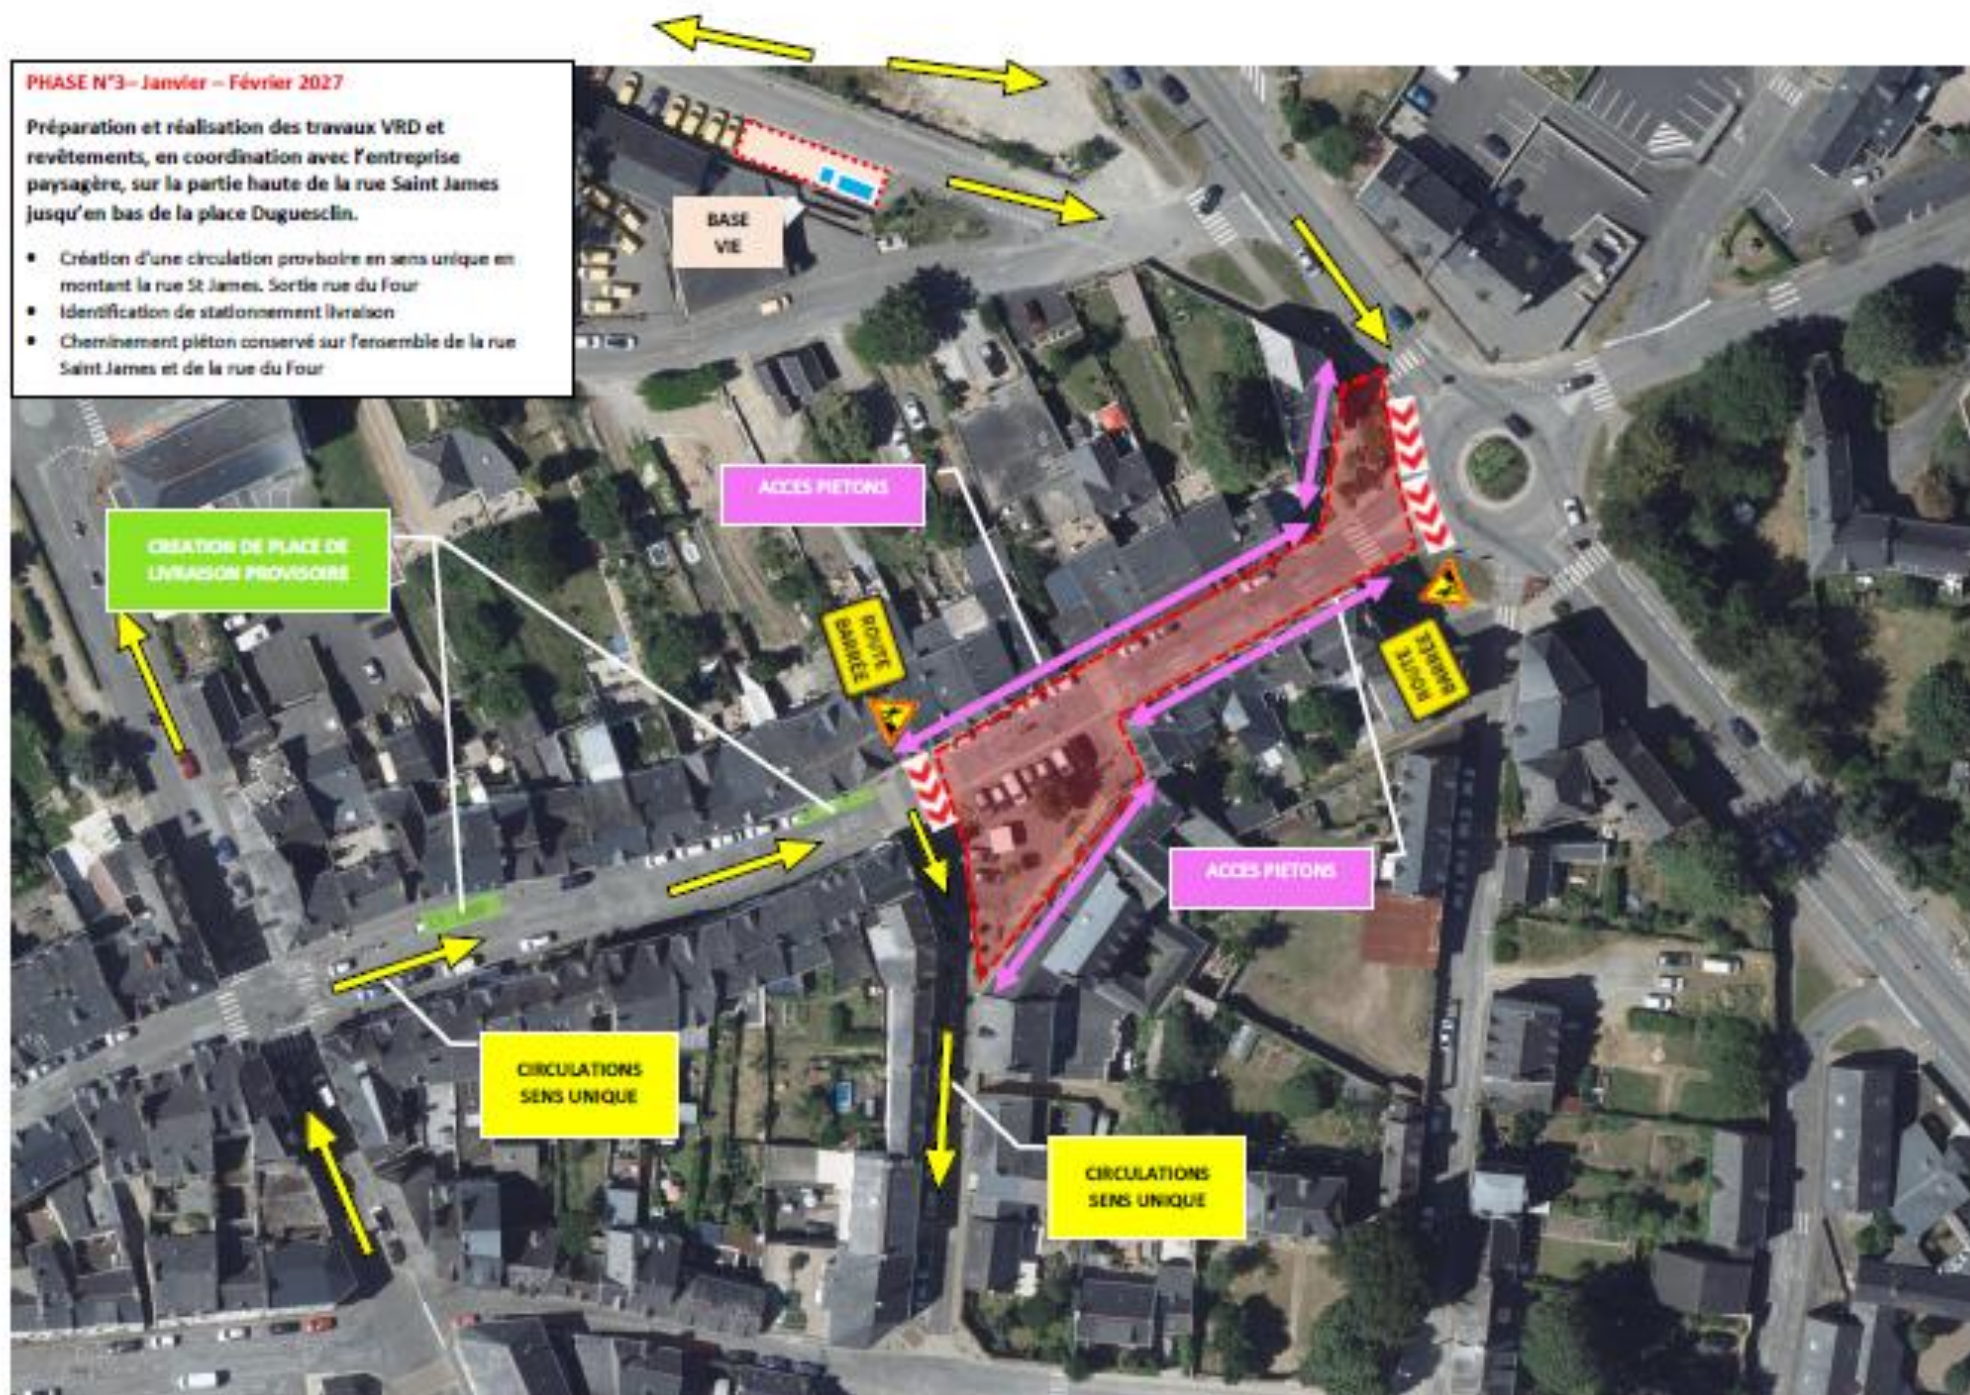

PHASE N°3 BIS Février 5-6-7-8-9 2027

• PAVAGE CHAUSSEE


ROUTE BARREE

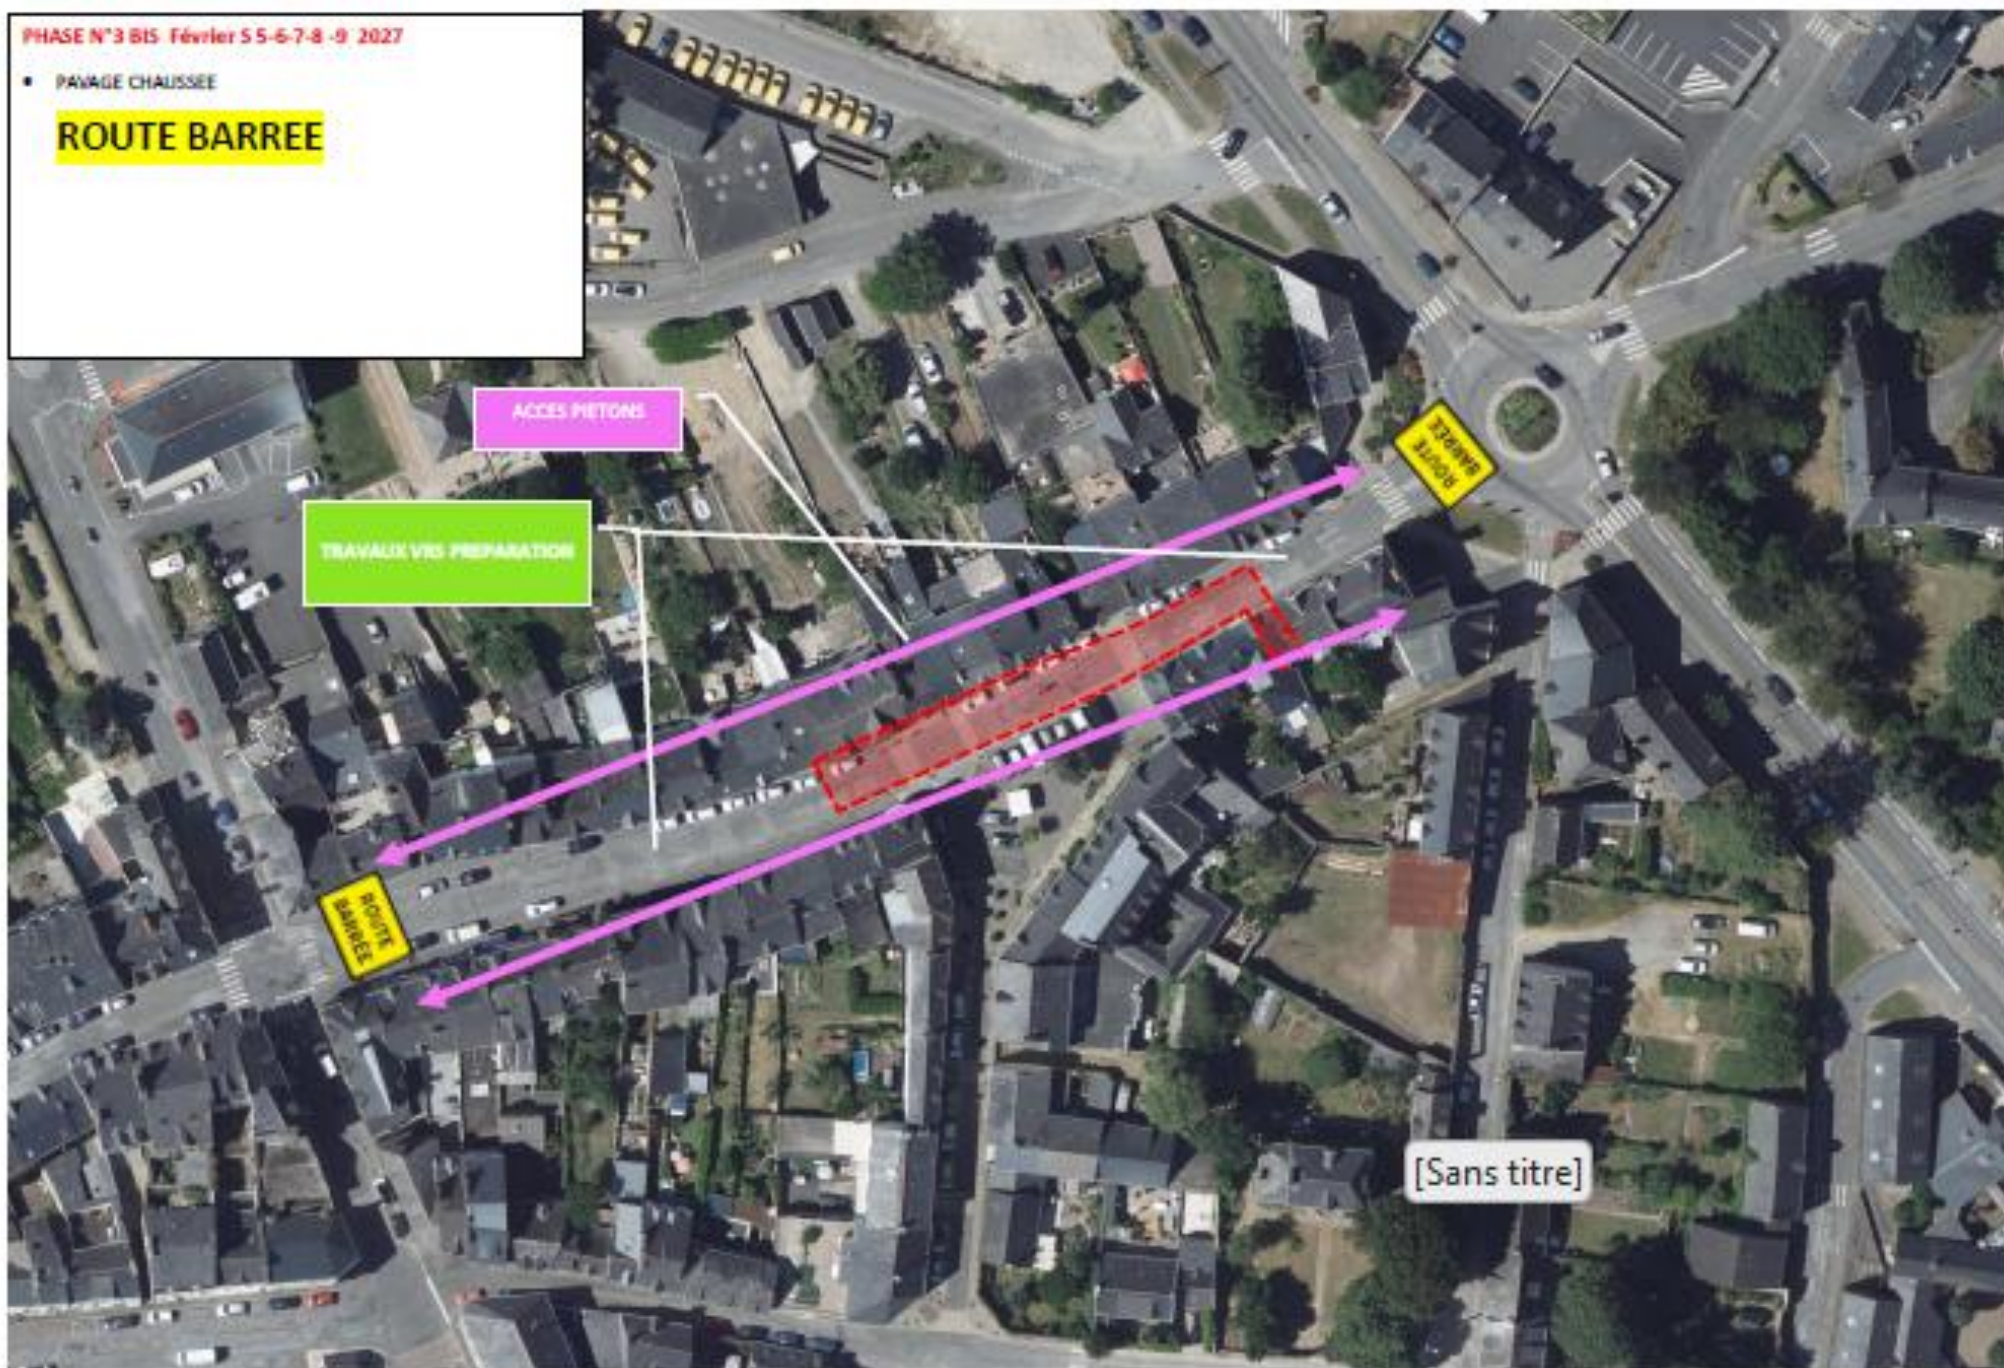

PLAN DE DEVIATION

PHASE N°4a – MARS 2027


- Préparation et réalisation des travaux VRD et revêtements, en coordination avec l'entreprise paysagère, sur la partie basse de la rue Saint James
- Remise en circulation du haut de la rue Saint James. Décalage d'une petite partie des finitions pour créer une sortie sur la rue du Four
- Livraison possible sur les nouvelles places créées
- Cheminement piéton conservé sur l'ensemble de la rue Saint James et de la rue du Four

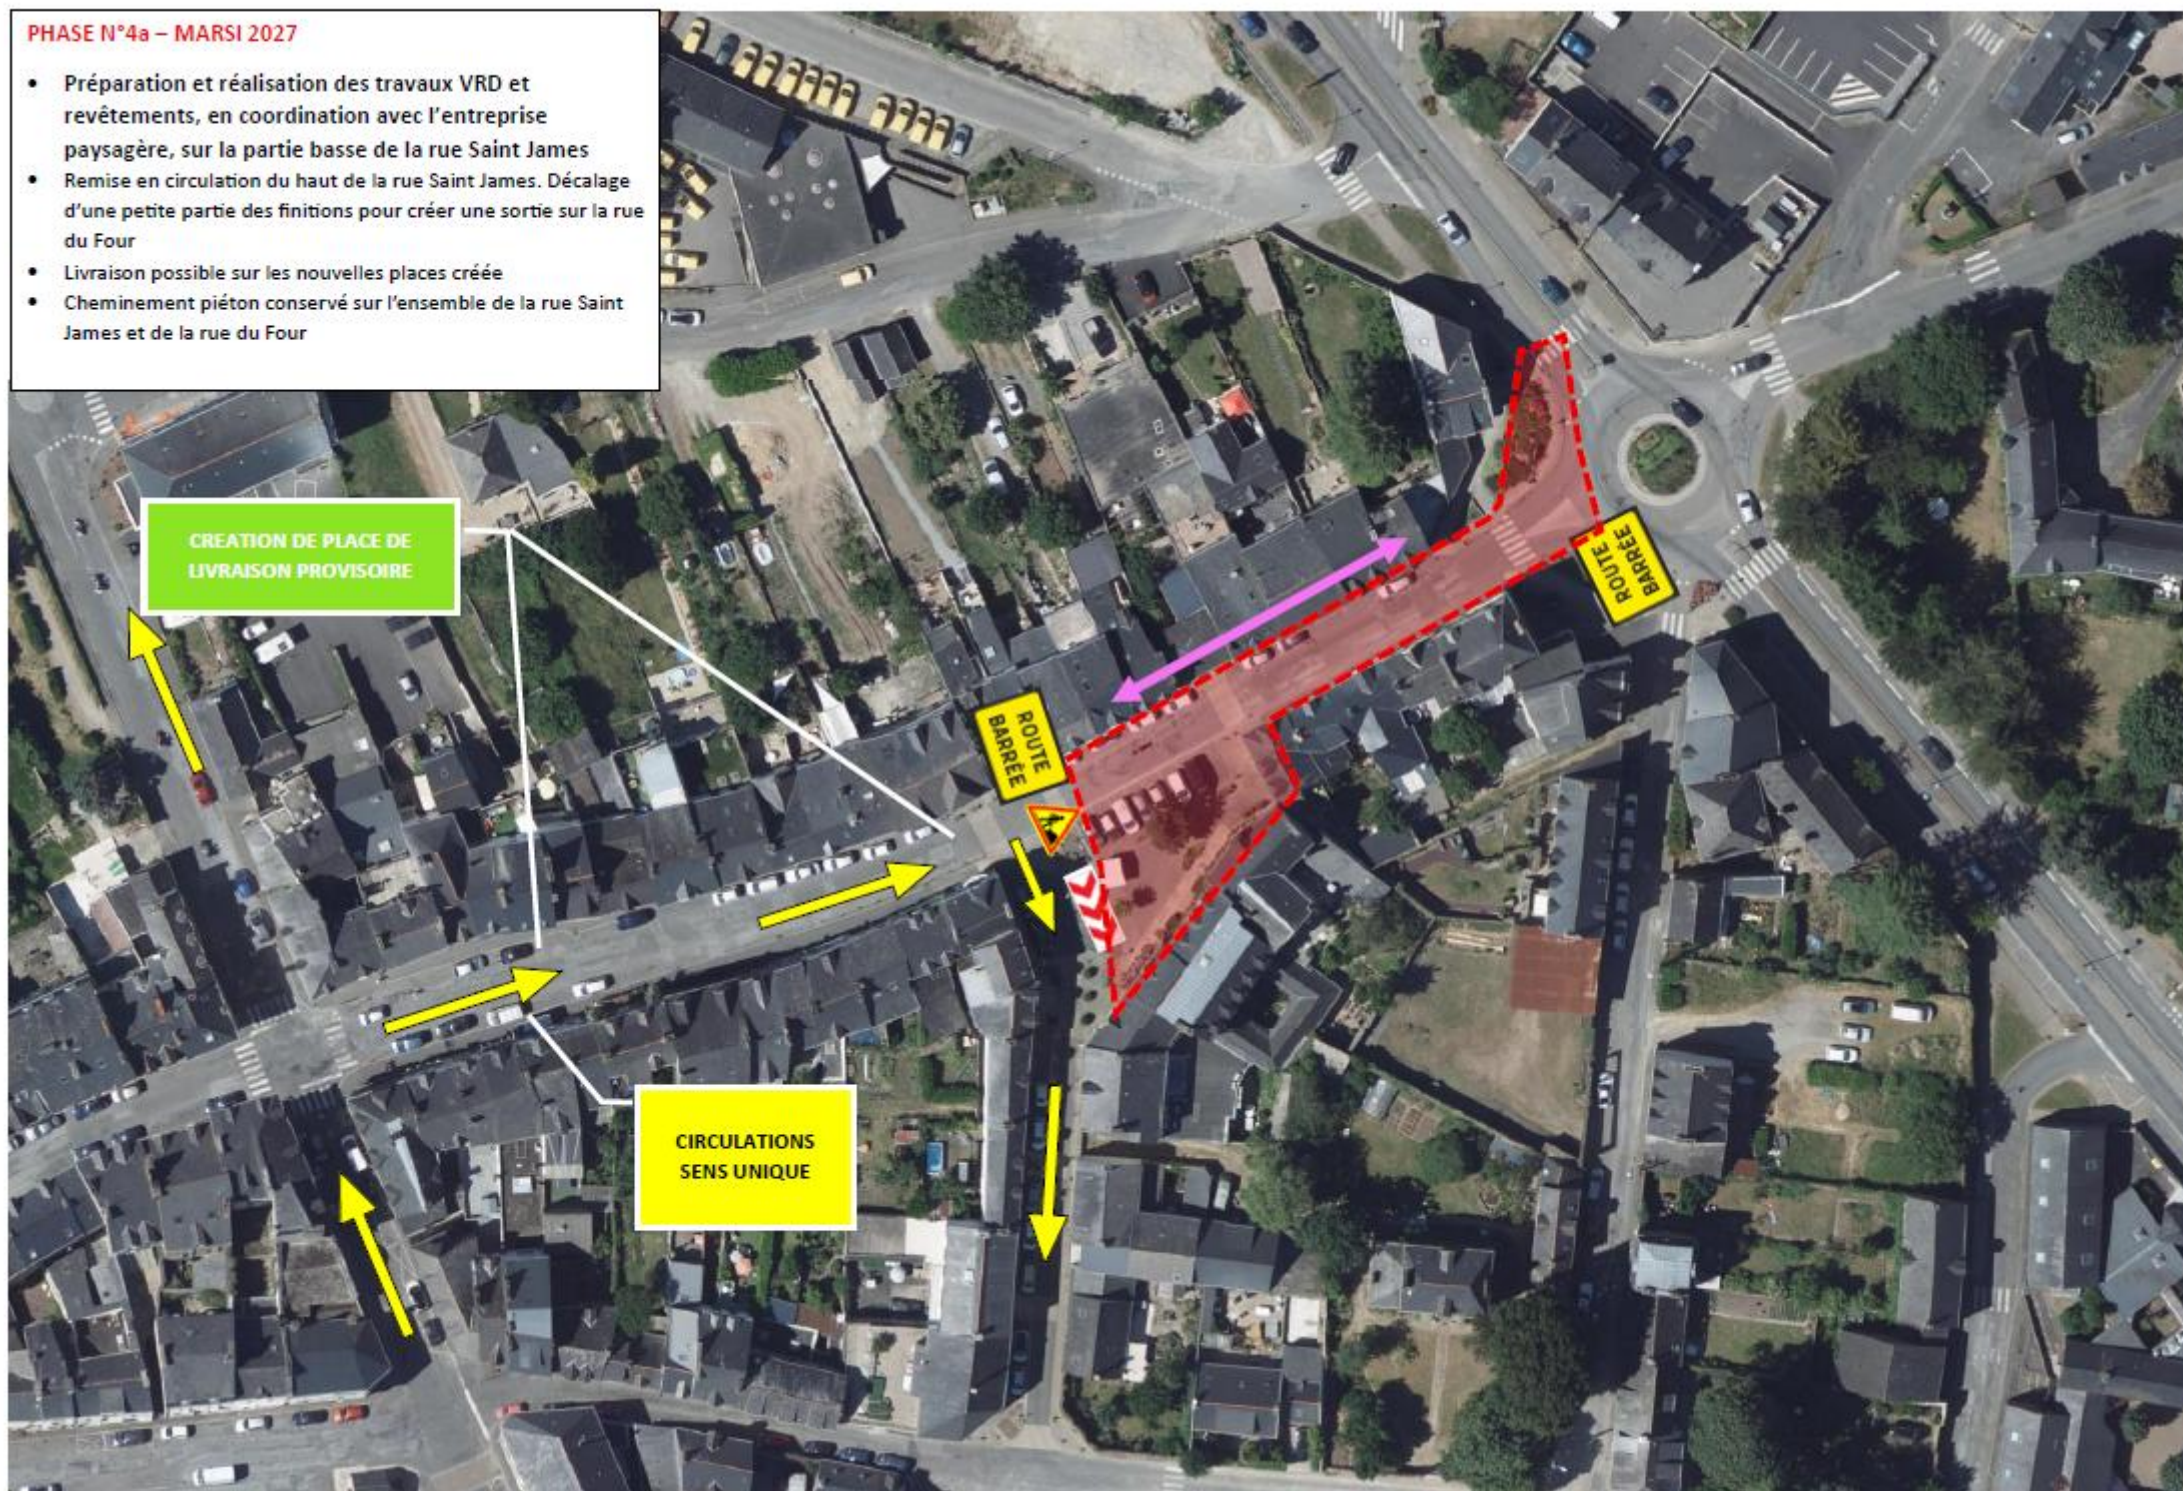

PLAN DE DEVIATION

PHASE N°4b – Avril 2027

- Préparation et réalisation des travaux VRD et revêtements, en coordination avec l'entreprise paysagère, sur la partie basse de la rue Saint James
- Remise en circulation du haut de la rue Saint James. Décalage d'une petite partie des finitions pour créer une sortie sur la rue du Four
- Livraison possible sur les nouvelles places créées
- Cheminement piéton conservé sur l'ensemble de la rue Saint James et de la rue du Four

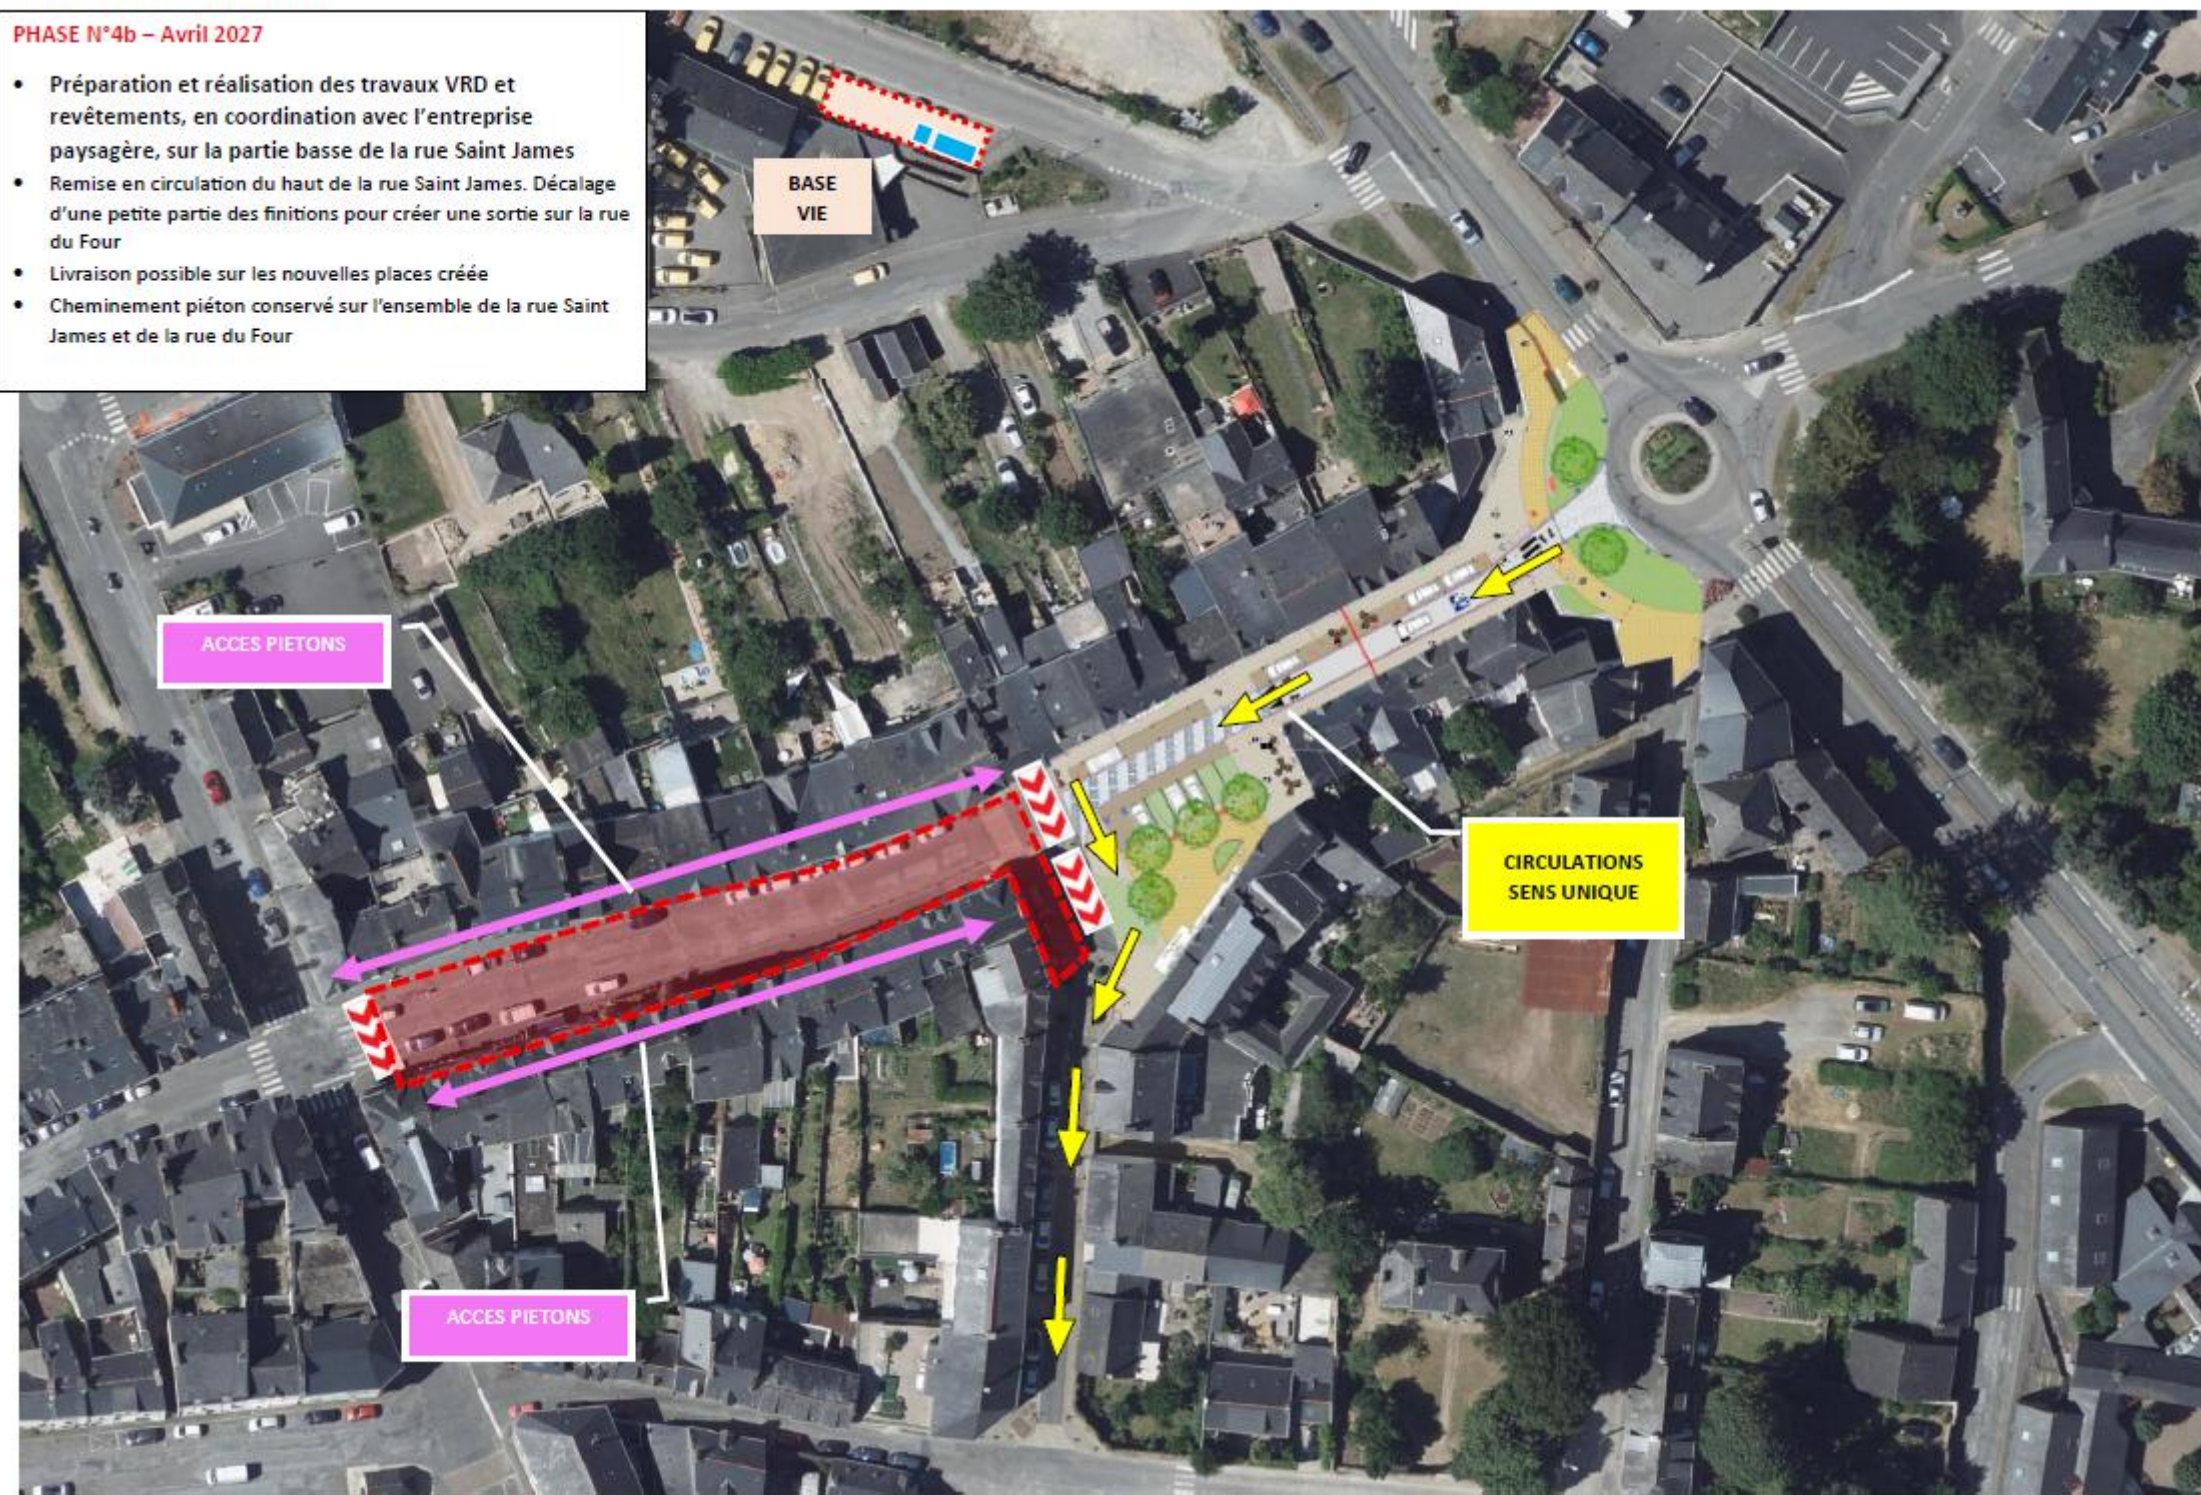

PLAN DE DEVIATION





Planning



The image features a white background with several stylized, golden leaves. A large leaf is on the left, and smaller ones are scattered on the right and bottom. The leaves have a fine, grid-like texture. A vertical black bar is on the far right.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
